


*Totale cartoline pervenute
n. 386
di cui n. 295 esatte e
n. 91 errate*

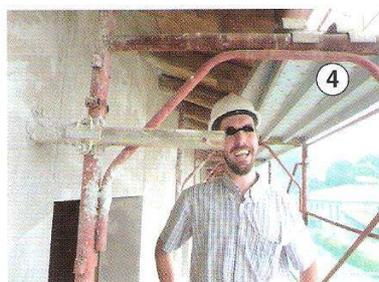

**Le situazioni irregolari sono le seguenti:
2-3- 4-5 -7-8.**

- 2) Ponteggio utilizzato per armatura muro incompleto di parapetti, armatura soletta senza alcuna protezione contro il rischio di caduta inoltre i ferri di chiamata non sono protetti.
- 3) Armatura 2° solaio senza protezioni, bocca di lupo non protetta e la scala che da accesso al 2° solaio non è ancorata.
- 4) Tubo per l'ancoraggio del ponteggio sporgente sulla campata (altezza uomo) non segnalato e non protetto.
- 5) Ponteggio privo di corrente superiore.
- 7) Innalzamento tavolato interno con ponte su cavalletto il cui piano di lavoro è irregolare in quanto realizzato con pannelli d'armatura.
- 8) Lavori di realizzazione copertura in legno su trabattello sprovvisto di parapetti e sottoponte di sicurezza.

Dato che erroneamente molti hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:

- 1) Betoniera a bicchiere sotto regolare impalcato di protezione contro il rischio di caduta di materiale dall'alto.
- 6) Vano scala protetto con regolare parapetto compreso tavola fermapiede.
- 9) Panoramica di ponteggio con regolari parapetti e impalcati compreso il parapetto per interventi in copertura.

